

**MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DE  
L'EQUIPEMENT**

-----  
**UNITE NATIONALE DE COORDINATION**  
-----

**REPUBLIQUE DU MALI**  
*Un Peuple - Un But - Une Foi*  
-----

# **PROJET D'AMELIORATION DE L'ACCESSIBILITE EN MILIEU RURAL (PAAR)**

## **RAPPORT N°2 D'AVANCEMENT DES ACTIVITES**

**26 Février 2018**

## Table des matières

|   |    |
|---|----|
| Liste des abréviations.....   | 3  |
| I. LE PROJET D'AMELIORATION DE L'ACCESSIBILITE RURALE (PAAR).....   | 4  |
| II. PRINCIPAUX REPERES.....   | 4  |
| III. ETAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITES.....   | 4  |
| 1. Composante 1 – Aménagement des Pistes Rurales .....  | 4  |
| 1.1. Convention MOD avec l'AGETIER.....   | 4  |
| 1.2. Travaux des 445 km de la phase 1 du Projet .....   | 5  |
| 1.3. Pistes de la phase II.....   | 8  |
| 1.4. Sauvegarde Environnementale et Sociale .....   | 9  |
| 1.5. Identification et évaluation des besoins en aménagements connexes pour les pistes aménagées de la phase 1.....                         | 9  |
| 2. Composante 2 – Entretien Courant et sécurité routière .....  | 10 |
| 2.1. Sécurité Routière.....   | 10 |
| 2.2. Processus de sélection de deux ONG pour l'intermédiation sociale et le suivi des travaux d'entretien courant par la méthode HIMO ..... | 10 |
| 3. Composante 3 – Appui Opérationnel.....   | 11 |
| 3.1. Situation financière.....  | 11 |
| 3.2. Mise en œuvre des activités d'engagement citoyen .....   | 11 |
| 3.3. Mise à jour du manuel de procédures administrative, financière et comptable et du système informatisé de gestion financière .....      | 11 |
| 3.4. Manuel d'Exécution .....   | 12 |
| 3.5. Suivi/Evaluation.....  | 12 |
| 3.6. Les recrutements.....  | 12 |
| 3.7. Soumission du PTBA.....  | 13 |
| 3.8. Création du Comité de Pilotage .....   | 13 |
| 3.9. Acquisitions et installation du logiciel informatique de gestion .....   | 13 |
| 3.10. Acquisition des véhicules .....   | 13 |
| IV. ANNEXES .....   | 14 |
| ANNEXE 1 : Cartes de localisation des pistes des phases 1 et 2 .....  | 15 |
| ANNEXE 2 : PLANNING D'EXECUTION DES TRAVAUX DU PAAR POUR LES PHASES I ET II.....  | 17 |
| ANNEXE 3 : LISTE DES AMENAGEMENTS CONNEXES PAR REGION.....  | 18 |
| ANNEXE 4 : RECOMMANDATIONS DE LA RENCONTRE DE SUIVI DES ACTIVITES D'ENGAGEMENT CITOYEN DU PAAR du 01 Février 2018.....                      | 21 |

## Liste des abréviations

|         |  |
|---------|--|
| AGETIER | Agence d'Exécution des Travaux d'Investissement et d'Équipement Ruraux                 |
| ANO     | Avis de Non Objection  |
| APD     | Avant Projet Détaillé  |
| APS     | Avant Projet Sommaire  |
| CSCOM   | Centre de Santé Communautaire  |
| DAO     | Dossier d'Appel d'Offres   |
| DGMP    | Direction Générale des Marchés Publics   |
| DNACPN  | Direction Nationale de l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances |
| DNR     | Direction Nationale des Routes   |
| DP      | Demande de Propositions  |
| F CFA   | Franc de la Communauté Financière Africaine  |
| IDA     | Association Internationale pour le Développement                                       |
| MOD     | Maitrise d'Ouvrage Déléguée  |
| ODP     | Objectif de Développement du Projet  |
| OHVN    | Office de la Haute Vallée du Niger   |
| ONG     | Organisation Non Gouvernementale   |
| OS      | Ordre de Service   |
| PAAR    | Projet d'Amélioration de l'Accessibilité Rurale  |
| PAP     | Populations affectées par le projet  |
| PAR     | Plan Abrégé de Recasement  |
| PGES    | Plan de Gestion Environnementale et Sociale  |
| TDR     | Termes De Référence  |
| UNC     | Unité Nationale de Coordination  |

## I. LE PROJET D'AMELIORATION DE L'ACCESSIBILITE RURALE (PAAR)

- 1. Objectif de développement (ODP) :** Améliorer et pérenniser l'accès routier des communautés paysannes aux marchés et aux services de base dans la zone d'intervention du projet et, en cas de crise ou d'urgence admissibles, y apporter une réponse immédiate et efficace.
- 2. Composantes du projet :** le PAAR sera exécuté à travers quatre (4) composantes dans les régions de Sikasso et de Koulikoro à savoir : (i) Composante 1 – Aménagement des Pistes Rurales(US\$ 63,8 millions équivalent, 100 % IDA) ; (ii) Composante 2 – Entretien Courant et sécurité routière (équivalent d'US\$ 8,6 millions, dont US\$ 3 millions financé par l'IDA et US\$ 5,6 millions financés par l'Etat Malien) ; (iii) Composante 3 – Appui Opérationnel (US\$ 3,6 millions équivalent, dont US\$ 3,22 millions financé par l'IDA et US\$ 0,4 financé par l'Etat Malien) et (iv) Composante 4 – Intervention d'Urgence (US\$ 0.00).
- 3. Coûts et Financement :** le montant total du financement du projet est évalué à 76 millions de dollars US dont 70 millions de dollars US (92%) sur crédit IDA N°6124-ML et 6 millions de dollars US (8%) de contrepartie du Gouvernement du Mali.

## II. PRINCIPAUX REPERES

- 4. Les principales dates à retenir sont les suivantes :**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Mise en place des fonds de préparation   | 21 Septembre 2016   |
|  |                     |
| Evaluation du projet   | 04 au 14 Avril 2017 |
| Négociations   | 24 et 26 Mai 2017   |
| Approbation par le Conseil d'Administration de l'IDA   | 17 Juillet 2017     |
| Signature de l'Accord de Financement   | 01 Août 2017        |
| Approbation par le Conseil des Ministres de l'Ordonnance et du Décret de Ratification de l'Accord de Financement | 23 Août 2017        |
| Publication au Journal Officiel (N° 14 Spécial)  | 18 Septembre 2017   |
| Mise en vigueur  | 29 Septembre 2017   |
| Période d'Exécution  | 2017 – 2022         |

## III. ETAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITES

### 1. Composante 1 – Aménagement des Pistes Rurales

#### 1.1. Convention MOD avec l'AGETIER

- 5.** Les Conventions relatives aux 04 phases d'exécution des travaux du PAAR ont été signées entre l'AGETIER et les Conseils Régionaux de Sikasso et Koulikoro le 19/09/2017 pour un montant total 15 318 555 106 FCFA par région soit 14 872 383 598 FCFA TTC pour les contrats de travaux, les études techniques et le contrôle et 446 171 508 FCFA TTC pour les honoraires de maîtrise d'ouvrage déléguée.

6. Les travaux de la première phase portent sur un linéaire total de 204,12 km de pistes dans la région de Koulikoro et sur 240,85 km de pistes dans la région de Sikasso. La cartographie des pistes de la première phase est en annexe 1 au document.

### **1.2. Travaux des 445 km de la phase 1 du Projet**

7. La signature des marchés de six lots de pistes et de l'avenant au contrat pour le contrôle et la surveillance a eu lieu les 03 et 04/01/2018. Le marché du lot 2 de Sikasso a été signé le 15/01/2018. Tous les marchés signés ont été transmis à la Banque le 02/02/2018. Les OS ont été donnés à compter du 15 Janvier 2018. Le planning détaillé des activités sur MS PROJECT est présenté à l'annexe n°2 du présent rapport.

8. L'installation des différents chantiers, l'élaboration des plans d'exécution et des PGES chantiers sont en cours. L'UNC a reçu la première version des PGES chantiers les 29 et 31/01/2018 et a fait parvenir ses observations à l'AGETIER le 01/02/2018 qui ont été immédiatement transmises aux entreprises concernées. Il ressort que seul le PGES de l'Entreprise Abdoulaye Diawara dit Blo (Lot 2 de Koulikoro) prend en compte la majorité des mesures environnementales et sociales prévues dans l'EIES. Par conséquent, l'UNC n'a pas fait d'observation ni de commentaires sur ce PGES chantier et l'a soumis à l'avis de non objection de la Banque le 01/02/2018.

9. Les six autres entreprises devraient revoir leurs documents (PGES chantier) conformément aux observations et indications fournies par l'UNC et les soumettre à nouveau à son avis pour le 06/02/2018. De cette date au 12/02/2018, la version corrigée du PGES chantier de toutes les entreprises a été reçue à l'UNC, analysée et a été transmise à la Banque le 14/02/2018. Les observations de la Banque demandant la reprise de tous les PGES chantiers à l'image du modèle révisé de l'Entreprise Abdoulaye Diawara dit Blo (Lot 2 de Koulikoro) ont été reçues à l'UNC le 19/02/2018. Les nouvelles versions des documents (PGES chantier) ont été soumises à nouveau à l'avis de la Banque le 22/02/2018. L'ANO de la Banque a été obtenu sur tous les PGES chantier le 28/02/2018. Les travaux dont les plans d'exécution sont approuvés peuvent démarrer sur le terrain.

10. Les premières réunions mensuelles de suivi des chantiers ont lieu respectivement le 16 janvier 2018 dans la région de Sikasso et du 21 au 23 janvier 2018 dans la région de Koulikoro. Ses missions nous ont permis de faire le contrôle des tâches et le recueil des prévisions mensuelles et des approvisionnements pour les différents lots.

11. **Région de Sikasso.** Les entreprises ont été invitées à respecter les engagements mensuels formulés notamment en terme de mobilisation du personnel et des matériels, l'approvisionnement et à fournir un planning actualisé détaillé avant le 02 mars 2018. Aussi, l'attention des entreprises a été attirée sur l'abondance de la pluie dans la zone du projet.

12. Elles ont été invitées à organiser des réunions d'information et de sensibilisation avec les mairies des communes traversées, ainsi que la société civile (autorités villageoises,

jeunesse, hommes de culte) avant le démarrage des travaux. Elles ont également été informées que les prochaines réunions mensuelles se tiendront dans les bureaux de chantier qui seront désignés à cet effet pour chaque lot. Ces réunions auront lieu les 3èmes lundis pour le lot 01, 3èmes mardis pour le lot 02, 3èmes mercredis pour le lot 03 et 3ème jeudis pour le lot 04.

**13. Région de Koulikoro.** Pour la région de Sikasso, en attendant l'approbation des PGES chantier, les entreprises ont été invitées à respecter les engagements mensuels formulés notamment en terme de mobilisation du personnel et des matériels, l'approvisionnement et à fournir un planning actualisé détaillé pour le 02 mars 2018.

**14.** Les entreprises SITAC-Sa et le Groupement ECONI/EMOFAC ont été invitées à organiser une réunion d'information et de sensibilisation avec les mairies des communes traversées, ainsi que la société civile (autorités villageoises, jeunesse, hommes de culte) avant le démarrage des travaux comme l'a fait l'entreprise EAD dit Blo. Elles ont également été informées que les prochaines réunions mensuelles se tiendront dans les bureaux de chantier qui seront désignés à cet effet pour chaque lot. Ces réunions auront lieu les 4ème mardis pour le lot 01, 4ème mercredis pour le lot 02, 4ème jeudis pour le lot 03.

**15.** L'allotissement des pistes, leur localisation, les entreprises attributaires, les coûts et les délais des travaux sont présentés dans le tableau ci-dessous :

## SITUATION DES TRAVAUX DES 445 KM DE PISTES DE LA PHASE I DU PAAR

| Lot | Piste  | Longueur         | Entreprise                    | Coût<br>(F CFA TTC)  | Remise<br>site | Délai  | Fin Travaux     |
|-----|--|------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|--------|-----------------|
|     | <b>Région de Koulikoro</b>   | <b>204,12 km</b> |                               | <b>3 738 276 620</b> |                |        |                 |
|     | <b>Cercle de Kangaba</b>   |                  |                               |                      |                |        |                 |
| 1   | KANGABA – KARAN – NOUGANI ET LA BRETELLE TOBRILA - DJOUNGOULA  | 55,6 km          | SITAC SA                      | 872 059 246          | 08/01/2018     | 6 mois | 14 juillet 2018 |
|     | <b>Cercle de Kati</b>  |                  |                               |                      |                |        |                 |
| 2   | KATIDRALE-TORODO-FALADIE – DABAN – MARAKADOUGOU – SIRACORO-RIVIERE BLA ET BRETELLE ZEALA-BASSABOUGOU – FALADIE | 93,33 km         | EAD DIT BLO                   | 2 073 979 452        | 09/01/18       | 7 mois | 13 août 2018    |
|     | <b>Cercle de Kolokani</b>  |                  |                               |                      |                |        |                 |
| 3   | RIVIERE BLA – FASSA – TENDELMA – SIDO – KOLOKANI ET LA BRETELLE FASSA – GUIHOYO-TENDELMA                       | 55,19 km         | GRPMNT<br>ECONI SA/<br>EMOFAC | 792 237 922          | 09/01/18       | 6 mois | 14 juillet 2018 |
|     | <b>Région de Sikasso</b>   | <b>240,85 km</b> |                               | <b>3 368 089 271</b> |                |        |                 |
|     | <b>Cercle de Koutiala</b>  |                  |                               |                      |                |        |                 |
| 1   | RN12 à DEBELA – SONGUELA - BARAMANA  | 19,59 km         | ESS-BTP                       | 376 224 393          | 12/01/18       | 5 mois | 14 juin 2018    |
| 2   | RN12 à KONSEGUELA - KONINA - FLEUVE BANINFING (GLOA)   | 97,6 km          | SITAC SA                      | 885 984 994          | 12/01/18       | 7 mois | 13 août 2018    |
|     | <b>Cercle de Sikasso</b>   |                  |                               |                      |                |        |                 |
| 3   | RN11 à DOUMANABA - FONSEBOUGOU - SIBIRIFINA  | 39,20 km         | TMC SA                        | 925 294 999          | 11/01/18       | 6 mois | 14 juillet 2018 |
| 4   | SIBIRIFINA - DOUMANANI - N'TIOBOUGOU - BLENDIO - NIENA RN7 ET LA BRETELLE BLENDIO - KOUNIA                     | 84,46 km         | SOMAGEC<br>SARL               | 1 188 694 368        | 11/01/18       | 7 mois | 13 août 2018    |

### 1.3. Pistes de la phase II

16. Des missions de l'UNC et les conseils régionaux de Sikasso et Koulikoro, à travers des ateliers de validation, ont procédé à la sélection des pistes qui feront l'objet de traitement dans le cadre de la phase II du PAAR. Les travaux se sont déroulés en présence de plusieurs élus des communes desservies par lesdites pistes comme suit :

17. **Pour la région de Sikasso (238 km au total)**, le 19/12/2017, les pistes suivantes ont été sélectionnées et validées: (i) **Cercle de Bougouni** : Siobougou - Wola - Falani - Sanso /Bretelles: Wola – Dionkala (58 km). (ii) **Cercle de Kadiolo** : Loulouni - Nirouani – Ouattarasso – Kambo – Kadiolo (37 km). (iii) **Cercle de Kolondiéba** : Tiendaga – Fakola - Kotla - Sama - Dani - Frontière RCI et bretelle Fakola - Soukourani - Togodaba - Frontière RCI (116 km) et (iv) **Cercle de Yorosso** : Koury-Ngorola(27 km).

18. **Pour la région de Koulikoro (292 km au total)**, le 21/12/2017, les pistes suivantes ont été sélectionnées et validées: (i) **Cercles de Banamba/Koulikoro** :Kiban – Toukoroba – Tamani – Ségala - Nyamina (77 km). (ii) Sirakorola – Tougouni - Nyamina (72 km). (iii) Sirakorola – Toubacoura (28 km). (iv) Cercle de Dioïla : Fana –Nangola – Sorokoro - Bèlèko - Mèna (115 km).

19. Le projet de TDR pour les études APS/APD/DAO est reçu de la DNR le 04/01/2018 et soumis à l'avis de non objection de la Banque le 05/01/2018. L'ANO conditionnel de la Banque est obtenu le 06/01/2018. Les TDR corrigés suivants les observations de la Banque ont été transmis à l'AGETIER le 09/02/2018 pour attribution.

20. L'avis de manifestation d'intérêt pour les études techniques APS/APD et l'élaboration du DAO a été lancé le 20 décembre 2017 et le dépôt des offres a eu lieu le 10/01/2018. L'ouverture des offres a eu lieu le 10/01/2018. Le rapport d'évaluation des manifestations d'intérêt a été reçu à l'UNC le 02/02/2018 qui a transmis ses observations à l'AGETIER le 07/02/2018. La version corrigée avec la proposition finale de la liste restreinte est reçue à l'UNC le 09/02/2018 et n'appelle plus d'observations. Ainsi, le contrat relevant de la revue à posteriori, la suite des activités est prévue selon le calendrier ci-dessous :

| Activités   | Réalisation prévue | Activités   | Réalisation prévue |
|---|--------------------|---|--------------------|
| Elaboration de la DP par l'AGETIER et soumission à l'avis de l'UNC      | 19/02/2018         | Soumission rapport combiné, PV négociations et projet de Contrat à l'avis UNC | 11/05/2018         |
| ANO de l'UNC sur la DP  | 21/02/2018         | ANO de l'UNC sur le projet de contrat   | 21/05/2018         |
| Lancement DP  | 23/02/2018         | Signature contrat   | 28/05/2018         |
| Ouverture des offres techniques   | 30/03/2018         | Démarrage des prestations   | 04/06/2018         |
| Soumission Rapport d'évaluation des offres techniques à l'avis de l'UNC | 09/04/2018         | Dépôt du rapport d'APS  | 07/07/2018         |
| ANO de l'UNC sur rapport évaluation technique                           | 13/04/2018         | Rapport final d'APD   | 19/09/2018         |
| Ouverture des offres financières  | 23/04/2018         |   |                    |

#### 1.4. Sauvegarde Environnementale et Sociale

21. Le paiement des indemnités aux populations affectées par le projet (PAP) s'est déroulé du 14/11/2017 au 25/11/2017. Les copies des pièces d'identité et les procès-verbaux d'indemnisation des populations affectées sont disponibles pour attester de l'évidence des compensations. Un rapport des indemnisations, élaboré par le spécialiste des questions environnementales, a mis fin aux opérations de mise en œuvre des PARs de la phase I du projet. Tous ces documents ont été partagés avec la Banque et aucune plainte émanant des PAP n'a encore été enregistrée. Ils seront complétés par le rapport de mise en œuvre effective qui sera élaboré par un consultant indépendant et transmis à la Banque.

22. Suite à certaines contraintes d'ordre technique et administratif, la délivrance du permis environnemental par la DNACPN, initialement prévue pour fin novembre, a eu lieu le 12/01/2018.

23. Au titre des pistes de la phase II, l'avis de manifestation d'intérêt pour les études environnementales et sociales a été lancé le 22 janvier 2018 et le dépôt des dossiers et leur ouverture ont eu lieu le 05/02/2018.

| Activités  | Réalisation prévue* | Activités   | Réalisation prévue* |
|--|---------------------|---|---------------------|
| Soumission du rapport d'évaluation des dossiers de manifestation d'intérêt à l'avis de l'UNC | 19/02/2018          | ANO de l'UNC sur rapport évaluation   | 27/04/2018          |
| ANO de l'UNC   | 23/02/2018          | Ouverture des offres financières  | 11/05/2018          |
| Soumission de la short liste et du projet de DP à l'avis de non objection UNC                | 28/02/2018          | Soumission rapport d'évaluation combinée, PV négociations et projet de Contrat à l'avis UNC | 18/05/2018          |
| ANO de l'UNC   | 05/03/2018          | ANO de l'UNC sur le projet de contrat   | 24/05/2018          |
| Lancement DP   | 09/03/2018          | Signature contrat   | 01/06/2018          |
| Ouverture des offres techniques  | 13/04/2018          | Démarrage des prestations   | 11/06/2018          |
| Soumission Rapport d'évaluation des offres techniques à l'avis de l'UNC                      | 23/04/2018          | Rapport final d'EIES (en même temps que le rapport d'APD).                                  | 19/09/2018          |

\* Les dates de réalisation ont été estimées à partir de celles des études techniques, ci-dessus.

#### 1.5. Identification et évaluation des besoins en aménagements connexes pour les pistes aménagées de la phase 1

24. La liste prioritaire des aménagements de la phase I, conformément à l'allocation des pistes, a été élaborée du 02 au 06/01/2018. Elle comporte :

25. **Pour la région de Koulikoro** : 27 aménagements connexes composés de 5 points d'eau, 16 infrastructures scolaires (constructions de salles de classe et clôtures d'école), 4 équipements pour les femmes (périmètres maraîchers, plateformes) et 2 magasins villageois (voir la liste détaillée en annexe).

26. **Pour la région de Sikasso** : 29 aménagements connexes composés de 4 points d'eau, 17 infrastructures scolaires (constructions de salles de classe et clôtures d'école), 5 centres de santé, 1 magasin villageois et 2 équipements divers (voir la liste détaillée en annexe 2).

27. Les TDR et spécifications techniques relatifs aux aménagements connexes seront élaborés et soumis à l'avis de la Banque. L'UNC recrutera des firmes de consultants par catégorie d'aménagement, par lot et par région pour la réalisation des études techniques nécessaires et qui s'occuperont aussi du contrôle et de la surveillance des travaux.

28. Le lancement des avis de manifestation d'intérêt pour ces études techniques a eu lieu le 26/02/2018 et le dépôt des dossiers est prévu pour le 14/03/2018. L'ouverture des plis sera pour le 16/03/2018. Les rapports d'évaluation des dossiers de manifestations d'intérêt et le projet de DP seront soumis à l'avis de la DGMP le 05/04/2018. La suite des activités est prévue selon le calendrier ci-dessous :

| Activités   | Réalisation prévue | Activités  | Réalisation prévue |
|---|--------------------|--|--------------------|
| Elaboration de la DP par l'UNC et soumission à l'avis de la DGMP          | 05/04/2018         | Soumission rapport combiné, PV négociations et projet de Contrat à l'avis de la DGMP | 10/07/2018         |
| ANO de la DGMP sur la DP  | 12/04/2018         | ANO de la DGMP sur le projet de contrat  | 16/07/2018         |
| Lancement DP  | 15/04/2018         | Signature contrat  | 20/07/2018         |
| Ouverture des offres techniques   | 15/05/2018         | Démarrage des prestations  | 30/07/2018         |
| Soumission Rapport d'évaluation des offres techniques à l'avis de la DGMP | 30/05/2018         | Dépôt des rapports d'études provisoires  | 28/09/2018         |
| ANO de la DGMP sur rapport évaluation technique                           | 07/06/2018         | Rapport final  | 15/10/2018         |
| Ouverture des offres financières  | 20/06/2018         |  |                    |

29. Suite à la sélection des pistes de la phase II du projet, des missions d'identification et de priorisation des aménagements connexes relatifs à ces pistes seront conduites d'ici le 30/03/2018.

## 2. Composante 2 – Entretien Courant et sécurité routière

30. **Sécurité Routière.** Des TDRs envoyés par l'ANASER pour la formation en sécurité routière ont été soumis à l'avis de non objection de la Banque le 23/01/2018. Avis attendu.

31. **Processus de sélection de deux ONG pour l'intermédiation sociale et le suivi des travaux d'entretien courant par la méthode HIMO.** Le dépôt et l'ouverture des offres ont eu lieu le 21/11/2017. L'élaboration du rapport d'analyse a pris un léger retard pour recherche de compléments d'informations de la part de certaines ONG.

32. A la revue interne de qualité, il a été jugé nécessaire de relancer l'avis pour la région de Koulikoro, seulement deux (2) ONG ayant pu être qualifiées. La relance a eu lieu le 19/01/2018 et le dépôt des offres le 01/02/2018. L'ouverture des offres prévue pour le 14/02/2018 a été reportée au 20/02/2018 pour cause de lancement officiel des activités du projet à Koutiala le 15/02/2018. Le rapport d'évaluation des offres pourrait être disponible pour le 27/02/2018 pour la revue de qualité et adoption.

33. Le processus d'approbation de la DP pour la région de Sikasso a révélé un problème de mutation sur un nouveau logiciel de gestion des projets au niveau de la structure des marchés publics (DGMP) entraînant un ralentissement.

### **3. Composante 3 – Appui Opérationnel**

34. **Situation financière.** Le montant du crédit alloué au projet s'élève à 64 000 000 Euros soit 41 981 249 216 FCFA. A la date du 26/02/2018, le montant décaissé s'élève à 10 705 028,66 Euros ou 7 022 038 688 FCFA, soit un taux de décaissement de 16,73%.

35. Le montant des engagements cumulés s'élève à 8 059 084 711 FCFA soit 19,20%.

36. Mise en œuvre des activités d'engagement citoyen. Le spécialiste en communication et engagement citoyen a pris fonction le 01/12/2017. La mise en œuvre des activités contenues dans le plan d'action issu de l'atelier du 31 octobre au 03 novembre 2017 sur l'engagement citoyen a débuté sur le terrain (voir rapport y afférent ci-joint à l'annexe 3).

37. Une visioconférence s'est tenue le jeudi 01 Février 2018 à la Banque Mondiale pour passer en revue l'état d'avancement des activités de mise en œuvre du volet engagement citoyen et du mécanisme de gestion des plaintes du projet. A l'issue de la revue les recommandations formulées ont été organisées suivant le tableau à l'annexe 4 pour un suivi adéquat.

38. Le CCAP de Koulikoro a été mis en place du 24 au 29 décembre 2017 par l'UNC, avec l'appui du CCAP de Sikasso. Le bureau se compose de 21 membres dont seulement deux femmes.

39. A la suite de la mise en place du bureau : (i) Il a été demandé au PAAR de prendre les dispositions nécessaires pour la formation des membres du nouveau bureau en fonction des besoins exprimés et des dispositions du projet. (ii) le CCAP de Sikasso s'est engagé à aider son homologue de Koulikoro à recevoir des formations nécessaires et (iii) Il a été souhaité que le PAAR puisse appuyer les CCAP des deux régions à mener des activités qui leur reviennent sur le terrain conformément aux recommandations de l'atelier de Bamako sur l'Engagement Citoyen. Le rapport y afférent a été transmis à la Banque le 26/01/2018.

40. **Mise à jour du manuel de procédures administrative, financière et comptable et du système informatisé de gestion financière.** Le Projet de rapport du manuel de procédures administrative, financière et comptable et du système informatisé de gestion financière a été transmis à la Banque pour observation le 14/09/2017. La Banque a donné son avis de non objection conditionnel le 27/12/2017. La prise en compte des observations de la Banque a nécessité des recherches d'informations complémentaires. Le rapport finalisé a été transmis à la Banque le 27/02/2018.

**41. Manuel d'Exécution.** Le manuel d'Exécution validé en comité technique a été transmis à la Banque pour observation le 08/06/2017. La Banque a donné son avis de non objection conditionnel le 27/12/2017 et l'ANO définitif sur le rapport final le 22/02/2019.

**42. Suivi/Evaluation.** Le cadre des résultats du projet prévoit le renseignement d'un certain nombre d'indicateurs dès la première année de mise en œuvre (2018). Il s'agit de :

| <b>Objectif de Développement du Projet (ODP)</b>  |                    | <b>Indicateurs de Résultats Intermédiaires</b>   |                    |
|---|--------------------|--|--------------------|
| <b>Intitulé de l'indicateur</b>   | <b>Valeur 2018</b> | <b>Intitulé de l'indicateur</b>  | <b>Valeur 2018</b> |
| Taux des produits agricoles évacués <b>(pourcentage)</b>  | 30                 | Composante 1 : Linéaire de pistes rurales aménagées <b>(kilomètres, cumulé)</b>                          | 400                |
| Nombre d'écoles et de centres de santé (Cscm + dispensaires + maternités) désenclavés <b>(nombre cumulé)</b>                            | 200                | Composante 1 : Equipements connexes réalisés <b>(nombre cumulé)</b>                                      | 25                 |
| Nombre de personnes bénéficiant d'une route praticable en toute saison réalisée par le projet dont part de femmes. <b>(Pourcentage)</b> | 185 000<br>(51)    | Composante 2 : Nombre de campagnes de sensibilisation effectuées dans les écoles <b>(nombre)</b>         | 25                 |
|   |                    | Composante 3 : Part des plaintes documentées et traitées dans les délais (30 jours) <b>(pourcentage)</b> | 90                 |

**43.** Ces indicateurs seront renseignés en fin d'année. Toutefois, les outils de collecte des données pour le renseignement de l'ensemble des indicateurs seront préparés et partagés avec les structures partenaires en charge de la fourniture des informations au plus tard le 30/03/2018.

**44. Les recrutements.**

**45. Recrutement d'un Spécialiste des Questions Sociales.** Concernant le recrutement du spécialiste des questions sociales, le dépôt des offres a eu lieu le 09/10/2017 et l'ouverture des offres le 12/10/2017. L'ANO conditionnel de la Banque sur le rapport d'évaluation des offres est reçu le 17/11/2017 et les interviews des deux candidats présélectionnés ont eu lieu le 08 Janvier 2018.

**46.** A l'analyse des résultats combinés, il a été convenu de relancer le processus du recrutement par l'élaboration des TDR révisés le 30/01/2018. L'avis a été publié dans les journaux locaux les 13 (Le Républicain), 14 (l'Indépendant) et 15/02/2018 (l'Essor) et les offres sont attendues pour le 02/03/2018.

**47. Recrutement d'un Auditeur Interne.** Le processus a été relancé le 02/10/2017 suite aux observations de la Banque. L'ouverture des offres de la relance a eu lieu le 06/11/2017 et le

rapport d'analyse des offres est soumis à l'avis de la Banque le 30/11 puis le 04/12/2017. Une première relance a été faite le 27/01/2018. L'ANO de la Banque est attendu.

**48. Recrutement d'un consultant en appui à l'UNC.** Un seul pli ayant été reçu, l'ouverture et l'évaluation des offres initialement prévues pour le 05/10/2017 ont été reportées au 26/10/2017 dans la perspective de recevoir plus de soumissions. A la suite de la relance, trois (03) nouveaux dossiers ont été reçus et l'ouverture des offres a eu lieu le 30 au 31 octobre 2017. Le consultant retenu a été invité à soumettre une offre technique et une offre financière qui ont été passées en revue par l'UNC. Les négociations ont eu lieu le 23/01/2018.

**49. Recrutement d'un RAF.** Les TDR pour le recrutement d'un RAF a été soumis à la Banque pour avis le 30/11/2017. Une première relance a été faite le 27/01/2018. L'ANO est attendu.

**50. Recrutement d'un auditeur externe.** Les TDR relatifs au recrutement de l'auditeur externe ont été élaborés et soumis à la Banque le 11/08/2017 pour avis de non objection. L'ANO est attendu.

**51. Recrutement d'un archiviste.** Les TDR sont en cours de finalisation et seront soumis à la Banque avant pour avis de non objection.

**52. Soumission du PTBA.** Un projet de PTBA sur 14 mois a été élaboré par l'UNC et soumis à l'avis de non objection de la Banque le 26/12/2017. Les commentaires de la Banque ont été reçus le 10/01/2018. La version corrigée a été envoyée à la Banque le 27/02/2018.


**53. Création du Comité de Pilotage.** Le projet d'Arrêté de désignation de des membres du Comité de Pilotage est en cours de signature.

**54. Acquisitions et installation du logiciel informatique de gestion.** Le contrat est signé le 23/01/2018 et l'ordre de service a été donné le 30/01/2018 pour délai d'exécution de 15 jours. Le logiciel a été fourni et installé. La formation des usagers est en cours.


**55. Acquisition des véhicules.** L'ouverture des offres est intervenue le 05/12/2017. Le contrat est entré dans le circuit de signature le 15/02/2018.

## IV. ANNEXES

## ANNEXE 1 : Cartes de localisation des pistes des phases 1 et 2

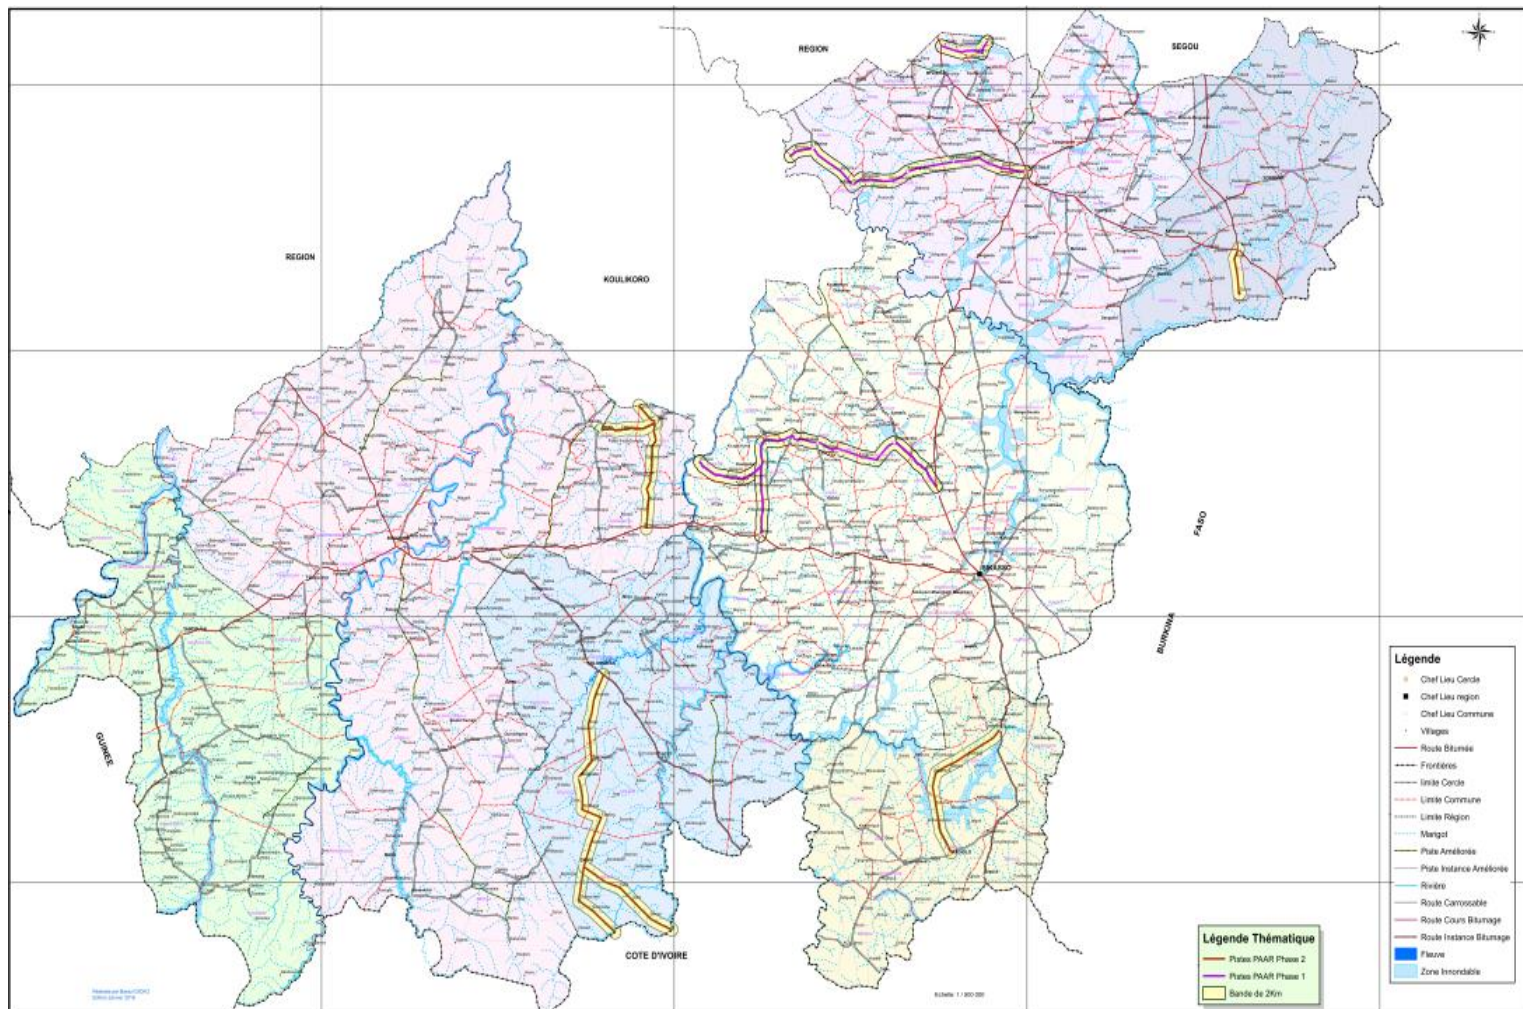

**Cartographie des pistes des phases 1&2 pour la région de Sikasso**

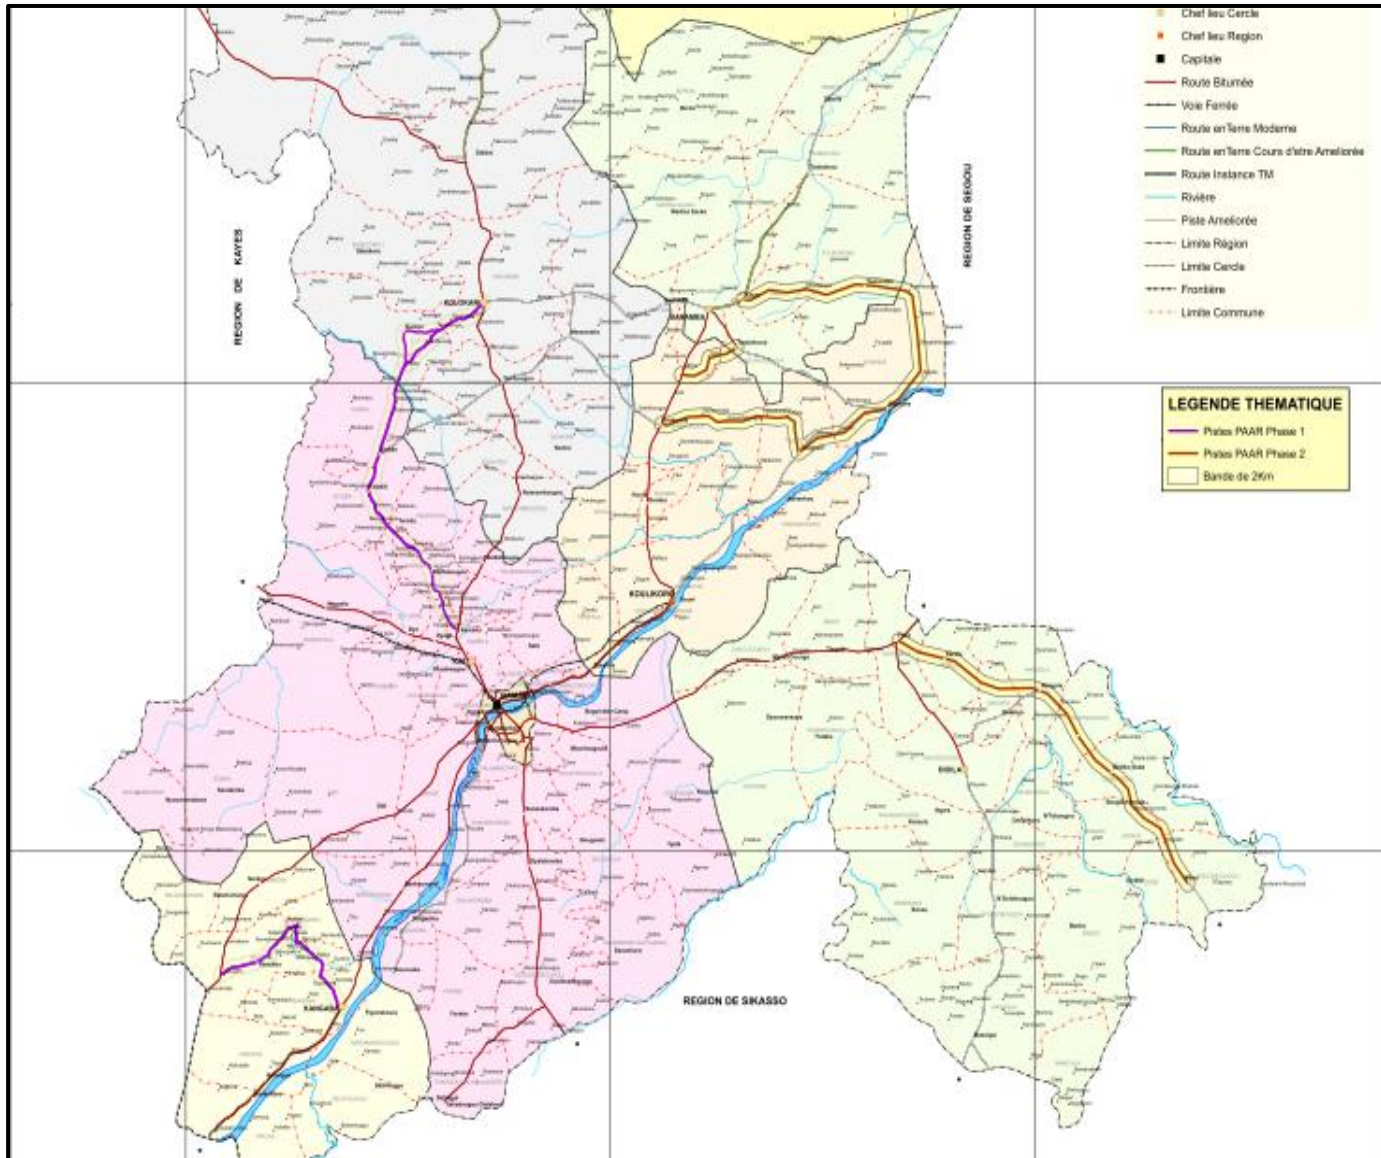

Cartographie des pistes des phases 1&2 pour la région de Koulikoro

## ANNEXE 2 : PLANNING D'EXECUTION DES TRAVAUX DU PAAR POUR LES PHASES I ET II

| N° | Nom de la tâche   | Durée      | Début        | Fin          | 2017 |    | 2018 |    | 2019 |    | 2020 |    |  |  |  |  |
|----|---|------------|--------------|--------------|------|----|------|----|------|----|------|----|--|--|--|--|
|    |   |            |              |              | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 |  |  |  |  |
| 1  | <b>PLANNING DES ACTIVITES</b>   | 1055 jours | Lun 11/09/17 | Ven 31/07/20 |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |
| 2  | <b>TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE 1 700 KM DE PISTES RURALES</b>  | 1055 jours | Lun 11/09/17 | Ven 31/07/20 |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |
| 3  | <b>ANNEE 1 : AMENAGEMENT DE 445 KM DE PISTES RURALES</b>  | 719 jours  | Lun 11/09/17 | Ven 30/08/19 |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |
| 4  | Finalisation du DAO   | 5 jours    | Lun 11/09/17 | Ven 15/09/17 |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |
| 5  | Lancement du DAO  | 30 jours   | Mer 20/09/17 | Jeu 19/10/17 |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |
| 6  | Ouverture, Evaluation et Réévaluation des offres des entreprises  | 55 jours   | Ven 20/10/17 | Mer 13/12/17 |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |
| 7  | Revue du rapport d'évaluation par l'UNC   | 2 jours    | Jeu 14/12/17 | Ven 15/12/17 |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |
| 8  | Notification de l'attribution provisoire aux entreprises  | 2 jours    | Lun 18/12/17 | Mar 19/12/17 |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |
| 9  | Elaboration des projets de marchés  | 3 jours    | Mer 20/12/17 | Ven 22/12/17 |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |
| 10 | Séance de travail à la Banque avec les prestataires sur le PGES, Règlement intérieur et guide de bonne conduite | 1 jour     | Jeu 28/12/17 | Jeu 28/12/17 |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |
| 11 | Signature des marchés   | 3 jours    | Ven 29/12/17 | Dim 31/12/17 |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |
| 12 | Réalisation des travaux   | 210 jours  | Lun 15/01/18 | Dim 12/08/18 |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |
| 13 | Réception provisoire des travaux  | 5 jours    | Lun 20/08/18 | Ven 24/08/18 |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |
| 14 | Réception définitive des travaux  | 5 jours    | Lun 26/08/19 | Ven 30/08/19 |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |
| 15 |   |            |              |              |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |
| 16 | <b>ANNEE 2 : AMENAGEMENT DE 400 KM DE PISTES RURALES</b>  | 971 jours  | Lun 04/12/17 | Ven 31/07/20 |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |
| 17 | <b>Recrutement de Bureaux d'études (études techniques et contrôle des travaux et environnement)</b>             | 290 jours  | Lun 04/12/17 | Mer 19/09/18 |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |
| 18 | Transmission des TDRs par le Maître d'Ouvrage (DNR)   | 5 jours    | Lun 04/12/17 | Ven 08/12/17 |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |
| 19 | Préparation des avis de manifestation d'intérêt (bureaux d'études et environnementaliste)                       | 9 jours    | Lun 18/12/17 | Mar 26/12/17 |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |
| 20 | Lancement des avis de manifestation d'intérêt   | 15 jours   | Mer 27/12/17 | Mer 10/01/18 |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |
| 21 | Ouverture et analyse des dossiers de manifestations d'intérêts  | 20 jours   | Jeu 11/01/18 | Mar 30/01/18 |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |
| 22 | Revue du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêt et de la DP par l'UNC                                | 15 jours   | Mer 31/01/18 | Mer 14/02/18 |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |
| 23 | Lancement des demandes de propositions  | 30 jours   | Jeu 15/02/18 | Ven 16/03/18 |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |
| 24 | Ouverture des offres techniques et évaluation   | 15 jours   | Lun 19/03/18 | Lun 02/04/18 |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |
| 25 | Ouverture des offres financières et évaluation  | 7 jours    | Mar 03/04/18 | Lun 09/04/18 |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |
| 26 | Négociation des contrats  | 3 jours    | Mar 10/04/18 | Jeu 12/04/18 |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |
| 27 | Revue du projet de contrat négocié par l'UNC  | 5 jours    | Ven 13/04/18 | Mar 17/04/18 |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |
| 28 | Signature des contrats  | 5 jours    | Mer 18/04/18 | Dim 22/04/18 |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |
| 29 | Etudes techniques (APS/APD/DAO) et validations ainsi que les études environnementales et sociales               | 150 jours  | Lun 23/04/18 | Mer 19/09/18 |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |
| N° | Nom de la tâche   | Durée      | Début        | Fin          | 2017 |    | 2018 |    | 2019 |    | 2020 |    |  |  |  |  |
|    |   |            |              |              | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 |  |  |  |  |
| 30 | <b>Réalisation des travaux</b>  | 670 jours  | Lun 01/10/18 | Ven 31/07/20 |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |
| 31 | Lancement du DAO  | 30 jours   | Lun 01/10/18 | Mar 30/10/18 |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |
| 32 | Ouverture et Evaluation des offres des entreprises  | 30 jours   | Mer 31/10/18 | Jeu 29/11/18 |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |
| 33 | Revue du rapport d'évaluation par l'UNC   | 5 jours    | Ven 30/11/18 | Mar 04/12/18 |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |
| 34 | Publication des résultats et signature des marchés  | 20 jours   | Mer 05/12/18 | Lun 24/12/18 |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |
| 35 | Réalisation des travaux   | 210 jours  | Mar 25/12/18 | Lun 22/07/19 |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |
| 36 | Réception provisoire des travaux  | 5 jours    | Mar 23/07/19 | Sam 27/07/19 |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |
| 37 | Réception définitive des travaux  | 5 jours    | Lun 27/07/20 | Ven 31/07/20 |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |

**ANNEXE 3 : LISTE DES AMENAGEMENTS CONNEXES PAR REGION  
REGION DE KOULIKORO**

| PISTES / STATUT   | CERCLES  | COMMUNES               | VILLAGES                           | Aménagement choisi                  |
|---|----------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|   | Kati     | Kambila                | Kambila (2km, d)                   |                                     |
| Drale (Kati) - Faladiè -<br>Daban - Marakadougou<br>Sirakoro  | Kati     | Kambila                | Kati Drale                         |                                     |
|   |          |                        | Fanafiècoro                        | Construction de 3 salles de classe  |
|   |          |                        |                                    |                                     |
|   |          | Diago                  | Ouolokoro (2km, g)                 |                                     |
|   |          |                        | Diago (2km, g)                     |                                     |
|   |          |                        | Sokolombougou                      | Construction de 3 salles de classe  |
|   |          |                        |                                    |                                     |
|   |          | Kalifabougou           | Kababougou                         | Construction de 3 salles de classe  |
|   |          |                        | Ouassorola                         | Clôture de l'école                  |
|   |          |                        | Ouènzambougou (2km, g)             |                                     |
|   |          |                        | Kalifabougou                       |                                     |
|   |          |                        | N'Golobougou                       |                                     |
|   |          |                        | Missira (ouest)                    |                                     |
|   |          |                        | Niamana                            |                                     |
|   |          |                        | Djidiè                             |                                     |
|   |          | Dièdougou              | Djéfalé                            | Construction magasin de stockage    |
|   |          |                        | Torodo                             |                                     |
|   |          |                        | Bourakèbougou                      | Périmètre maraîcher pour les femmes |
|   |          |                        | N'Tjibougou                        | Périmètre maraîcher pour les femmes |
|   |          |                        | Kountou                            | Construction magasin de stockage    |
|   |          |                        | Zéala                              | Transformation Forage en AES        |
|   |          |                        |                                    |                                     |
|   |          | N'Tjiba                | N'Téguedo                          | Construction de 3 salles de classe  |
|   |          |                        | Bassabougou                        | Clôture de l'école                  |
|   |          |                        | Konkou Zambougou                   | Clôture de l'école                  |
|   |          |                        | Faladiè                            | Clôture de l'école                  |
|   |          |                        |                                    |                                     |
|   |          | Daban                  | Daban                              |                                     |
|   |          |                        | Sanguébougou (2km, g)              | Forage avec AES                     |
|   |          |                        | Marakadougou Sirakoro              |                                     |
|   |          | Diessébougou           |                                    |                                     |
|   |          | Bananko/Tièssamabougou | Construction de 3 salles de classe |                                     |
|   |          | Yorobougou (2km, g)    |                                    |                                     |
|   |          |                        |                                    |                                     |
| Sirakoro Niaré - Fassa -<br>Guioyo - Kolokani<br>Bretelle : Fassa - Siranindji<br>- Guihoyo - Téfléma | Kolokani | Guihoyo                | Fassa                              | Clôture de l'école                  |
|   |          |                        | Djidiana                           | Périmètre maraîcher pour les femmes |
|   |          |                        | Djinindiè                          | Réhabilitation de l'école publique  |
|   |          |                        | Siranindji                         | Réhabilitation de l'école publique  |
|   |          |                        | Guihoyo                            | Clôture de l'école (premier cycle)  |

| PISTES / STATUT           | CERCLES | COMMUNES | VILLAGES             | Aménagement choisi                 |
|---------------------------|---------|----------|----------------------|------------------------------------|
|                           |         |          | Tèfléma              | Plateforme multifonctionnelle      |
|                           |         | Kolokani | Sanamblé             | Forage équipé                      |
|                           |         |          | Sido                 | Forage avec AES                    |
|                           |         |          | Kolokani             |                                    |
| Kangaba - Karan – Nougani | Kangaba | Minidian | Kangaba              |                                    |
|                           |         |          | Gouloumbi            |                                    |
|                           |         |          | Kondola (2km, d)     |                                    |
|                           |         |          | Sélinkégny           | Construction de 3 salles de classe |
|                           |         |          | Bakon                |                                    |
|                           |         |          | Mokoyako             |                                    |
|                           |         | Kéniéba  | Koba                 |                                    |
|                           |         |          | N'Falila             | Construction de 3 salles de classe |
|                           |         |          | Tobriila             | Forage équipé                      |
|                           |         |          | Djoungoula           |                                    |
|                           |         |          | Sabala (2km, g)      |                                    |
|                           |         |          |                      |                                    |
|                           |         | Karan    | Karan                |                                    |
|                           |         |          | Kabada               |                                    |
|                           |         |          | Kabaran              |                                    |
|                           |         | Benkadi  | Bomborou             |                                    |
|                           |         |          | Fadioungoula         |                                    |
|                           |         |          | Habaladougou Kéniéba | Clôture de l'école                 |
|                           | Benkadi | Nougani  |                      |                                    |

## REGION DE SIKASSO

| PISTES / STATUT | CERCLES  | COMMUNES       | VILLAGES       | Aménagement choisi  |
|-----------------|----------|----------------|----------------|---|
|                 | Koutiala | Zanina         | Débéla         | Clôture école et construction de 03 classes                                     |
|                 |          |                | Songuéla       | Clôture école et construction de 03 classes                                     |
|                 |          |                | Baramana       | Clôture dispensaire et construction de 03 salles pour soins et hospitalisations |
|                 |          | N'Golonianasso | Ngorosso       | Clôture école et construction de 03 classes                                     |
|                 |          |                | Mpèlèkèssou    | Clôture école et construction de 03 classes                                     |
|                 |          |                | Ngolonianasso  | Clôture dispensaire et construction de 03 salles pour soins et hospitalisations |
|                 |          | Konséguéla     | Konsequela     | Aménagement de la voie d'accès au centre de santé et à l'école                  |
|                 |          |                | Finzankoro     | Clôture école et construction de 03 classes                                     |
|                 |          |                | Ouessérébougou | Clôture école et construction de 03 classes                                     |
|                 |          |                | N'Golobougou   | Forage équipé de château d'eau (AES)  |
|                 |          | Dièdougou      | Kouwo          | Forage équipé de château d'eau (AES)  |
|                 |          |                | Massabala      | Caniveaux de déviation des eaux de ruissellement sur le village                 |
|                 |          | Konina         | Konina         | Clôture du centre de santé et aménagement de sa voie d'accès                    |
|                 |          |                | Diona          | Clôture école et construction de 03 classes                                     |

| PISTES / STATUT   | CERCLES | COMMUNES  | VILLAGES      | Aménagement choisi                                   |
|---|---------|-----------|---------------|--|
|   |         |           | Niampela      |  |
|   |         |           | Nglo          |  |
| Tabaracoro –<br>Doumananba – Kounian<br><br>Bretelle : Blendio -<br>Nièna |         | Gongasso  | Tabarakoro    | Installation château d'eau sur forage existant       |
|   |         |           | N'Tjibougou   | Clôture école et construction de 03 classes          |
|   |         |           | Ngongasso     |  |
|   |         | Doumanaba | Zéguéna       | Clôture école  |
|   |         |           | Doumanamba    | Construction de 06 classes (2 <sup>ième</sup> Cycle) |
|   |         |           | Fonsébougou   | Forage équipé dans les nouveaux quartiers            |
|   |         |           | Faniéna       | Clôture école  |
|   |         |           | Sibirifina    | Clôture école et construction de 03 classes          |
|   |         | Tiankadi  | Zimbangola    | Clôture école  |
|   |         | Miria     | Dingasso      | Clôture école  |
|   |         |           | Doumanani     | Clôture école Premier Cycle                          |
|   |         | Dembéla   | Kessana       | Construction d'un Centre de Santé                    |
|   |         | Blendio   | Sanankoroni   | Clôture école et construction de 03 classes          |
|   |         |           | Kassoumbougou | Micro barrage sur rivière Koba                       |
|   |         |           | N'Tiobougou   | Clôture école et construction de 03 classes          |
|   |         |           | Blendio       | Magasin de stockage avec bureau                      |
|   |         | Benkadi   | Wéto          |  |
|   |         |           | Tiorona       |  |
|   |         |           | Koungoba      |  |
|   |         |           | Kounian       |  |

ANNEXE 4 : RECOMMANDATIONS DE LA RENCONTRE DE SUIVI DES ACTIVITES D'ENGAGEMENT CITOYEN DU PAARdu 01 Février 2018

| No | Description de l'Action   | Responsable                              | Echéance   | Réalisation              | Observation   |
|----|---|--|------------|--------------------------|---|
|    | <b>Volet Engagement Citoyen</b>   |  |            |                          |   |
|    | <u>Consultations :</u>  |  |            |                          |   |
| 1  | Développer des stratégies pour favoriser l'inclusion et les approches genre à travers le renforcement de la participation et la représentation des femmes dans les CCAP et lors de la formation des prochains bureaux et les séances de consultations             | <b>CCAP<br/>Koulikoro et<br/>Sikasso</b> |            |                          |   |
| 2  | Inviter les deux CCAP à préparer des plans d'actions de leurs activités, comme base de l'appui du projet avant le 15 février 2018.  |  | 15/02/2018 | 12/02/2018<br>13/02/2018 | Le Plan d'Actions du CCAP de Koulikoro est reçu à l'UNC le 12/02/2018<br>Le Plan d'Actions du CCAP de Sikasso est reçu à l'UNC le 13/02/2018  |
| 3  | Organiser des réunions de démarrage pour chaque tronçon de route pour mieux informer et sensibiliser les communautés surtout sur la consistance des travaux et leurs durées (Le plus tôt possible en collaboration avec AGETIER)                                  | <b>UNC</b>                               |            |                          |   |
| 4  | Documenter les résultats des consultations publiques qui sont des processus continus (déjà en cours) y inclure les listes de participants   | <b>UNC</b>                               |            | 26/02/2018               | Documents envoyés à la Banque (liste des participants aux consultations publiques, liste des comités de médiation et points focaux, contact et contrats des radios partenaires, liste CCAP Sikasso et Koulikoro). |
| 5  | Compléter les messages en cours de diffusion avec « où s'adresser en cas de problèmes ou de doléances et mentionner l'existence de Comités de médiation et les lieux de dépôt des doléances et comment les plaintes sont traitées. »                              | <b>UNC</b>                               |            | 05/02/2018               | Message radio sur les comités de médiation et points focaux produit et diffusé  |
| 6  | Diligenter l'élaboration des messages relatifs au processus de formulation, de la transmission des doléances aux comités de médiation, de l'enregistrement et du feedback.  | <b>UNC</b>                               |            | 27/02/2018               | Reportage radio sur la gestion des plaintes par les comités de médiation  |
|    | <u>Suivi Communautaire</u>  |  |            |                          |   |
| 1  | Acquisition de smartphones avec plan téléphonique avant le 15 février 2018  | <b>UNC</b>                               | 15/02/2018 | 26/02/2018               | Choix du Smartphone effectué avec la Banque et Orange Mali (TECNO RISE 32). Acquisition et plan téléphonique en cours de finalisation avec l'opérateur Orange Mali (d'abord).                                     |
| 2  | Organiser des rencontres conjointes points focaux et CCAP afin de clarifier rôles, attentes et expliciter les complémentarités des rôles et des tâches (formation des points focaux et des CCAP) le 28 février 2018   | <b>UNC</b>                               | 28/02/2018 | 30/03/2018               | Formation à réaliser courant mars 2018 après acquisition des Smartphones  |
| 3  | Elaborer 2 à 3 questions, simples et en rapport avec l'évolution des travaux sur le terrain, à poser par SMS et les réponses des communautés à analyser les smartphones à mettre à disposition des points focaux et des CCAP.                                     | <b>UNC</b>                               |            | 10/03/2018               | Questionnaire pour Smartphone à finaliser avant la formation des points focaux  |
|    | <b>Mécanisme de Gestion des Plaintes</b>  |  |            |                          |   |
| 1  | Clarifier et confirmer que la responsabilité du registre des plaintes revient au président du Comité de médiation et non au point focal. Au cas où le point focal reçoit des doléances, il doit informer les plaignants sur comment les soumettre au Comité et ne | <b>UNC</b>                               |            | 20/03/2018               | Registres des plaintes disponibles à transmettre aux présidents des comités de médiation courant mars 2018  |

| No | Description de l'Action   | Responsable | Echéance | Réalisation | Observation  |
|----|---|-------------|----------|-------------|--|
|    | doit pas les traiter lui-même.  |             |          |             |  |
| 2  | Utiliser le registre de plaintes qui se trouve dans les documents de sauvegardes et Compléter le formulaire en ajoutant le délai de traitement et la date de transmission de la résolution au plaignant.  | UNC         |          |             | Formulaire de remplissage des registres des comités de médiation conforme à celui des documents de sauvegarde avec délai de traitement |
| 3  | Pour les remontées d'informations à l'UNC :<br>1. utiliser le point focal pour la remontée à temps réel des informations en ce qui concerne le suivi communautaire à travers les SMS en les dotant de smartphone, d'un autre côté les Présidents des Comités de Gestion des plaintes en coordination avec la PIU et   | UNC         |          |             | Remontée des informations relatives au suivi communautaire par SMS par les points focaux   |
|    | 2. demander à la mission de contrôle dans son rapport mensuel un chapitre relatif au volet environnemental et social dans lequel il fera un sous point relatif aux statistiques relatives aux plaintes reçues et traitées et de ramener la liste des plaintes pendant leurs missions mensuelles.  | UNC         |          |             | Remontée mensuelle des informations sur les plaintes par la mission de contrôle au projet  |
|    | <b>Rôles/Responsabilités</b>  |             |          |             |  |
| 1  | L'expert social a la responsabilité du traitement, du suivi des plaintes et aussi de la gestion globale du mécanisme de gestion des plaintes. L'expert en suivi-évaluation est responsable de renseigner l'indicateur sur le mécanisme de gestion des plaintes. Etant donné que le recrutement de l'expert social est en cours, l'expert environnement est en charge du traitement, du suivi des plaintes et aussi la gestion globale du mécanisme de gestion des plaintes. | UNC         |          |             | L'expert environnement est responsable du traitement et du suivi des plaintes (avant le recrutement de l'expert social).               |
| 2  | Le CCAP n'étant pas à proximité des riverains n'est pas impliqué dans le volet mécanisme de gestion des plaintes. Il est impliqué dans la consultation et le suivi communautaire.   | UNC         |          |             | Les CCAP interviennent plutôt dans le suivi communautaire des travaux et non dans le mécanisme de gestion des plaintes                 |
